

1. 측정결과 - 2022. 04. 30.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 9대	#1	부지경계선1	9.94	245	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	9.92	245	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	9.93	245	0.0014	검출한계 이하
	#4	부지경계선4	9.96	245	0.0014	검출한계 이하
	#5	위생설비입구1	9.93	45	0.0040	이하
	#6	위생설비입구2	9.96	45	0.0036	이하
	#7	작업장주변	9.94	125	0.0032	이하
	#8	음압기공기배출구1	9.94	45	0.0040	이하
	#9	음압기공기배출구2	9.93	45	0.0037	이하
	#10	음압기공기배출구3	9.97	45	0.0040	이하
	#11	음압기공기배출구4	9.94	45	0.0040	이하
	#12	폐기물반출구1	9.97	45	0.0044	이하
	#13	폐기물반출구2	9.93	45	0.0044	이하


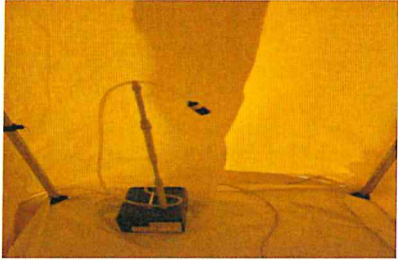








- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.







- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 9대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0016
	측정 시작 시간 09:12	측정 종료 시간 13:17	
부지경계선2			0.0016
	측정 시작 시간 09:14	측정 종료 시간 13:19	
부지경계선3			0.0014
	측정 시작 시간 09:17	측정 종료 시간 13:22	
부지경계선4			0.0014
	측정 시작 시간 09:19	측정 종료 시간 13:24	
위생설비 입구1			0.0040
	측정 시작 시간 09:33	측정 종료 시간 10:18	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
위생설비 입구2			0.0036
	측정 시작 시간 12:40	측정 종료 시간 13:25	
작업장주변			0.0032
	측정 시작 시간 10:24	측정 종료 시간 12:29	
음압기공기 배출구1			0.0040
	측정 시작 시간 09:27	측정 종료 시간 10:12	
음압기공기 배출구2			0.0037
	측정 시작 시간 09:29	측정 종료 시간 10:14	
음압기공기 배출구3			0.0040
	측정 시작 시간 13:02	측정 종료 시간 13:47	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구4			0.0040
	측정 시작 시간 13:04	측정 종료 시간 13:49	
폐기물반출 구1			0.0044
	측정 시작 시간 15:20	측정 종료 시간 16:05	
폐기물반출 구2			0.0044
	측정 시작 시간 15:40	측정 종료 시간 16:25	

1. 측정결과 - 2022. 05. 01.











측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 8대	#1	부지경계선1	9.95	245	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	9.95	245	0.0014	이하
	#3	부지경계선3	9.95	245	0.0014	이하
	#4	부지경계선4	9.94	245	0.0016	이하
	#5	위생설비입구	9.94	45	0.0040	이하
	#6	작업장주변	9.94	125	0.0032	이하
	#7	음압기공기배출구1	9.94	45	0.0037	이하
	#8	음압기공기배출구2	9.95	45	0.0037	이하
	#9	음압기공기배출구3	9.94	45	0.0040	이하
	#10	폐기물반출구	9.93	45	0.0044	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 8대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0016
	측정 시작 시간 08:56	측정 종료 시간 13:01	
부지경계선2			0.0014
	측정 시작 시간 09:02	측정 종료 시간 13:07	
부지경계선3			0.0014
	측정 시작 시간 09:05	측정 종료 시간 13:10	
부지경계선4			0.0016
	측정 시작 시간 09:08	측정 종료 시간 13:13	
위생설비 입구			0.0040
	측정 시작 시간 09:11	측정 종료 시간 09:56	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0032
	측정 시작 시간 09:22	측정 종료 시간 11:27	
읍압기공기 배출구1			0.0037
	측정 시작 시간 09:14	측정 종료 시간 09:59	
읍압기공기 배출구2			0.0037
	측정 시작 시간 09:15	측정 종료 시간 10:00	
읍압기공기 배출구3			0.0040
	측정 시작 시간 09:16	측정 종료 시간 10:01	
폐기물반출구			0.0044
	측정 시작 시간 15:02	측정 종료 시간 15:47	






1. 측정결과 - 2022. 05. 02.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
SARA-5100 / 7대	#1	부지경계선1	9.94	150	0.0023	이하
	#2	부지경계선2	9.92	150	0.0023	이하
	#3	부지경계선3	9.94	150	0.0026	이하
	#4	부지경계선4	9.95	150	0.0023	이하
	#5	위생설비입구	9.93	45	0.0040	이하
	#6	작업장주변	9.92	125	0.0032	이하
	#7	음압기공기배출구	9.97	45	0.0036	이하
	#8	폐기물반출구	9.96	45	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 SARA-5100 / 7대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0023
	측정 시작 시간 08:05	측정 종료 시간 10:35	
부지경계선2			0.0023
	측정 시작 시간 08:07	측정 종료 시간 10:37	
부지경계선3			0.0026
	측정 시작 시간 08:09	측정 종료 시간 10:39	
부지경계선4			0.0023
	측정 시작 시간 08:10	측정 종료 시간 10:40	
위생설비 입구			0.0040
	측정 시작 시간 08:15	측정 종료 시간 09:00	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0032
	측정 시작 시간 08:12	측정 종료 시간 10:17	
음압기공기 배출구			0.0036
	측정 시작 시간 08:17	측정 종료 시간 09:02	
폐기물반출 구			0.0040
	측정 시작 시간 09:05	측정 종료 시간 09:50	
